



TAMANDARÉ


PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ - PE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR

EMPRESA:		HBS EMPREENDIMENTOS EIRELI		CNPJ:	CNPJ: 40.419.104/0001-50		CONTRATO	09/6/2024		Boletim de Medição: 001							
OBJETO:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS NO PÁTIO DA IGREJA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ/PE								VALOR: 19.672,40		PERÍODO 12/09/2024 ÀTE 26/09/2024					
LOCAL:		MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ-PE								VIGÊNCIA: 30 DIAS		DATA: 26/09/2024					
Item		Códigos		Descrição dos Serviços		Und	PREVISTO NO CONTRATO		QUANTIDADES MEDIDAS		Acumulado Anterior		VALORES MEDIDOS		SALDO A MEDIR		
						Quant	VUNIT	VALOR TOTAL	Acumulado Anterior	Método no Período	Acumulado Anterior	Método no Período	Acumulado Total	Valores	%		
1		101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF 05/2020		m²	220,00	R\$ 99,42	R\$ 19.672,40		220,00	R\$	19.672,40	R\$ 19.672,40	R\$ -	0,00%		
		TOTAL						R\$ 19.672,40			R\$	19.672,40					
									VALOR CONTRATO		R\$ 19.672,40						
									VALOR ACUMULADO		R\$ 19.672,40						
									SALDO CONTRATO		R\$ -						
									VALOR MEDIÇÃO		R\$ 19.672,40						
				ENGENHEIRO FISCAL DO CONTRATO						EMPRESA							

✓ RELATORIO FOTOGRAFICO - PATIO DA IGREJA SANTO ANDRE

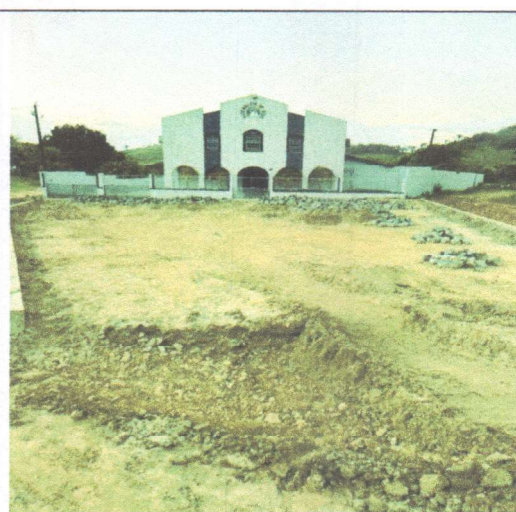



TAMANDARÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ - PE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

EMPRESA:	HBS EMPREENDIMENTOS EIRELI				CNPJ:	CNPJ: 40.419.104/0001-50		CONTRATO	096/2024		Boletim de Medição: 002						
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS NO PÁTIO DA IGREJA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ/PE								VALOR:	99.999,73		PERÍODO	27/08/2024 ÀTE 11/09/2024				
LOCAL:	MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ-PE								VIGÊNCIA:	30 DIAS		DATA: 11/09/2024					
Item	Códigos	Descrição dos Serviços	Und	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			VALORES MEDIDOS			SALDO A MEDIR				
				Quant	V.UNIT	VALOR TOTAL	Acumulado Anterior	Médio no Período	Acumulado Anterior	Médio no Período	Acumulado Total	Valores	%				
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 1.989,67											
1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTOINTELADORA, AF. 11/2019	m²	911,93	R\$ 0,14	R\$ 127,67	592,79	319,14	R\$ 82,99	R\$ 44,68	R\$ 127,67	R\$ -	0,09%				
1.2	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	R\$ 46,55	R\$ 1.862,00	40,00		R\$ 1.862,00	R\$ -	R\$ 1.862,00	R\$ -	0,00%				
2		PAVIMENTAÇÃO				R\$ 98.010,06											
2.1	94275	ASSENTAMENTO DE GILIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF.01/2024	M	212,28	R\$ 49,29	R\$ 10.463,28	137,98	74,30	R\$ 6.801,13	R\$ 3.662,15	R\$ 10.463,28	R\$ -	0,00%				
2.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF.05/2020	m²	911,93	R\$ 89,42	R\$ 81.544,78	592,75	319,18	R\$ 53.004,10	R\$ 28.540,68	R\$ 81.544,73	R\$ -	0,00%				
2.3	5680	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTENCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MTR. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO, AF.06/2014	CHP	40,00	R\$ 150,05	R\$ 6.002,00	26,00	14,00	R\$ 3.901,30	R\$ 2.100,70	R\$ 6.002,00	R\$ -	0,00%				
TOTAL						R\$ 99.999,73											
EMPRESA														VALOR CONTRATO		R\$ 99.999,73	
EMPRESA														VALOR ACUMULADO		R\$ 99.999,73	
EMPRESA														SALDO CONTRATO		R\$ -	
EMPRESA														VALOR MEDIÇÃO		R\$ 34.348,21	

✓ RELATORIO FOTOGRAFICO - PATIO DA IGREJA SANTO ANDRE

